



Seurantapalaveri 23.9.2021, viikko 38

Tuotannollinen koekäyttö II

FINGRID
Datahub



Puhujina:



Saku Palanne



Jyrki Autio



Matti Hietaranta



Lauri Ahonen

FINGRID
Datahub

Tuotannollinen koekäyttö II

Seurantapalaverin agenda 23.09.2021

- Aikataulumuutos
- Tuloksista
- Tuotannollinen koekäyttö
 - Validointitehtävien tilanne
- Kenraaliharjoitus

TUKO2-harjoitus jatkuu täysimittaisena ke 29.9.2021 klo 16:00 saakka

Olemme saaneet toimialalta useita pyyntöjä jatkaa TUKO2-harjoitusta, mahdollistaen osapuolille lisäpäiviä liiketoimintaprosessien testaamiseen.


Tutkimme lisäpäivien tarpeellisuutta harjoituksen hyväksyntäkriteereiden näkökulmasta ja millä toimenpiteillä meillä on mahdollisuus vastata tarpeeseen, vaarantamatta kenraaliharjoituksen aikataulua. Päädyimme jatkamaan täysimittaisena TUKO2-harjoitusta ke 29.9.2021 klo 16:00 saakka. Täysimittaisuus tarkoittaa sitä, että harjoitus jatkuu kaikkien sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden osalta, vaikka osa markkinaosapuolista olisikin jo saavuttanut hyväksyntäkriteerit.

Kaikkien markkinaosapuolien osallistumisella mahdollistetaan liiketoimintaprosessien päästä päähän testaamisen jatkaminen.


TUKO2-harjoituksen jatkaminen on tärkeää myös datahubille

- Harjoituksen jatkaminen tuo myös datahub-projektille tärkeitä lisäpäiviä järjestelmän testaukseen. Datahubin näkökulmasta on erityisen tärkeää, että mittaustietojen välittämistä jatketaan täydellä teholla.


Tuotannollisen koekäytön 2 rytmitys

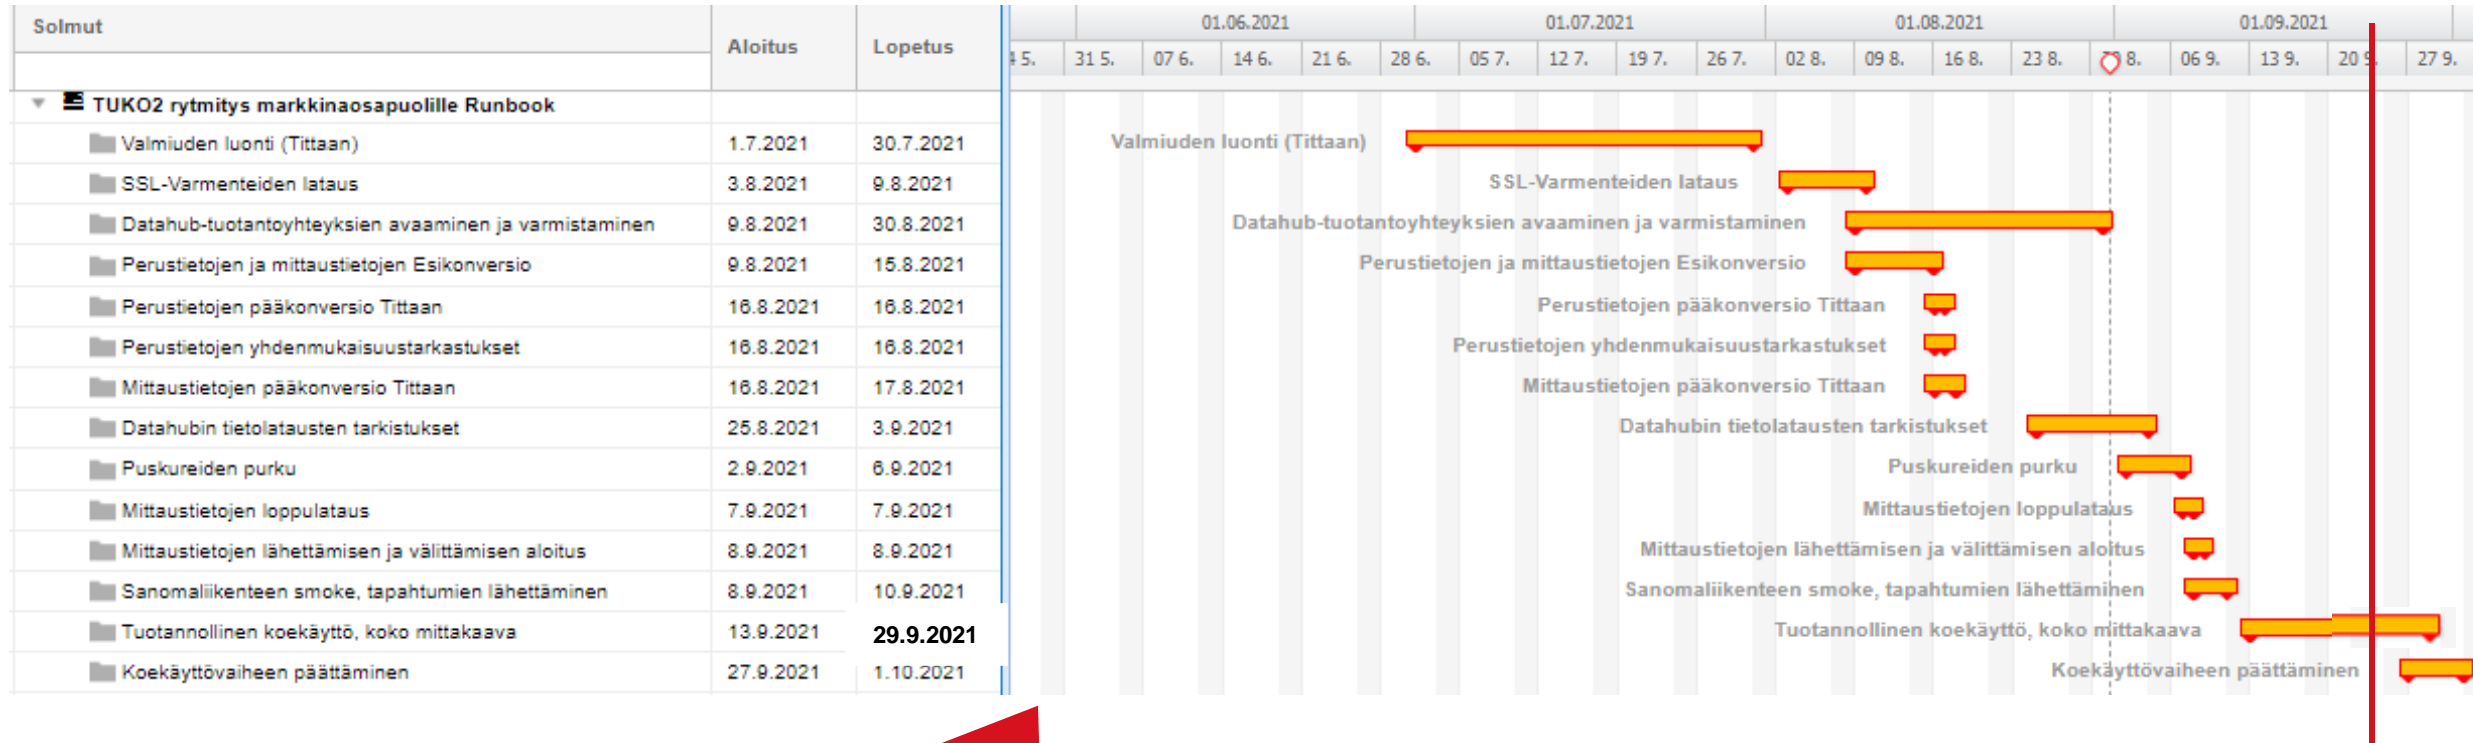

- Valmiudet Heinäkuun aikana
- 3.8 - 15.8 Yhteydet & Esikonversio Tittaani
- **16.8 Tiedot Tittaani & Kopio ATJ luonti**
- **8.9 Tuotannollinen koekäyttö alkaa**
- 13.9 Koekäyttö täydessä mittakaavassa
- **29.9 Koekäyttö päättyy**



Validointi tehtävien status


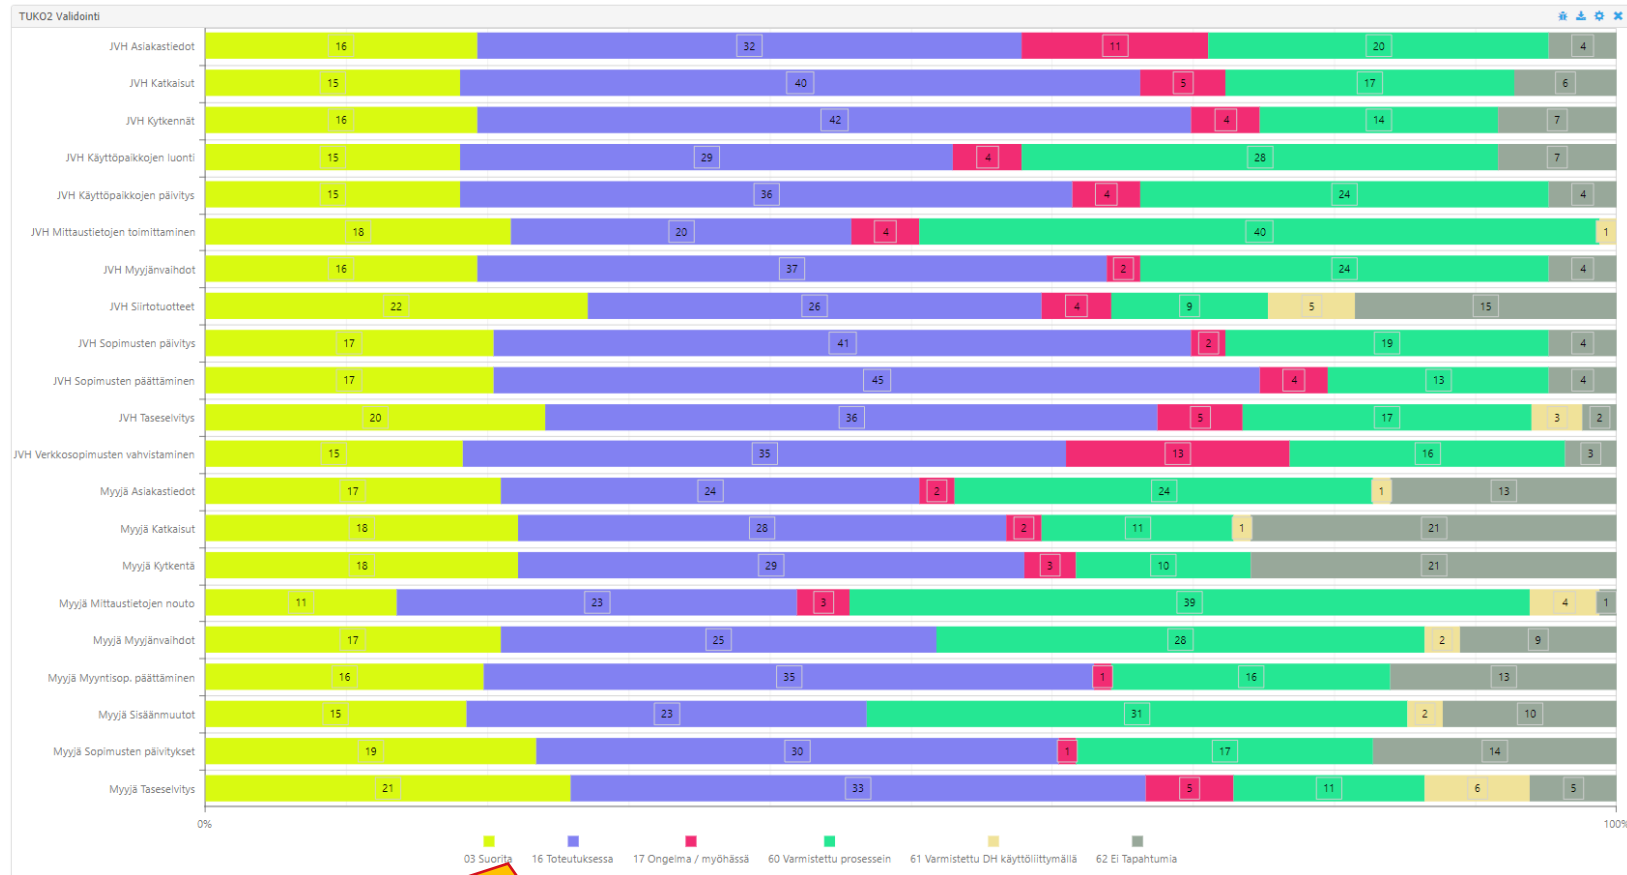


- Tehtävät tulee olla valmiina 29.9 mennessä!





Mittaustietojen toimituksen tilanne

- Mittaustietojen toimituksen tilanne 13.9. vuorokauden osalta. Tilanne poimittu 21.9.

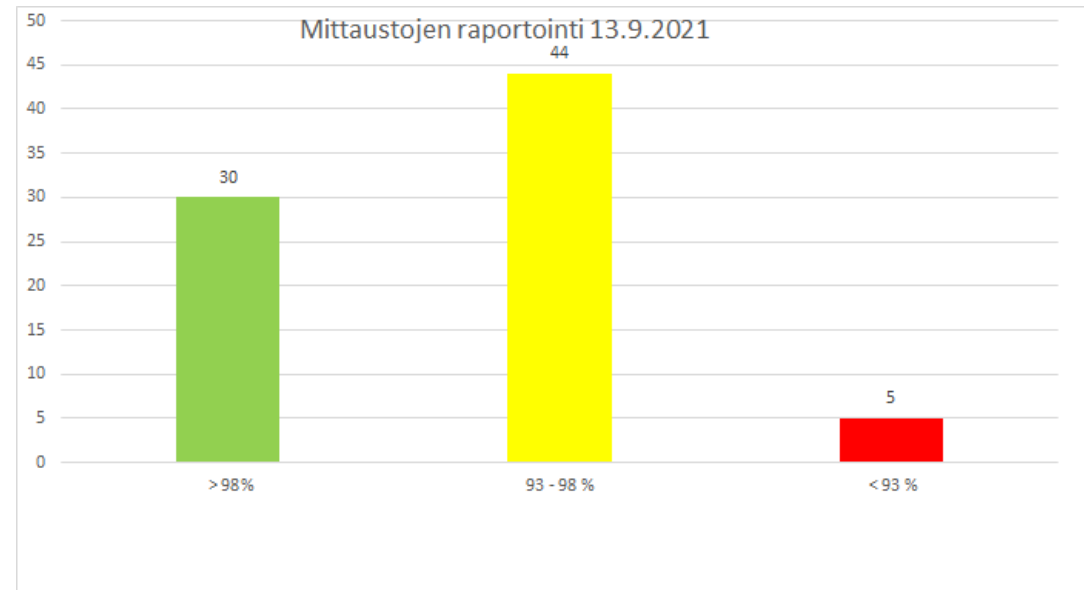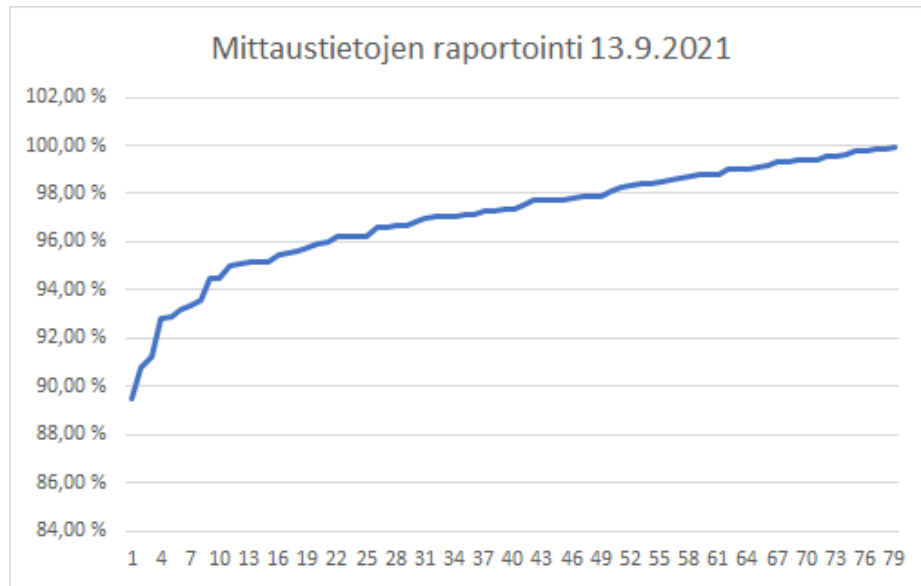

Taseselvityksen tilanne

- Taseselvityksen jakeluverkkojen osalta tilanne 13.9. vuorokauden osalta. Tilanne poimittu 21.9.

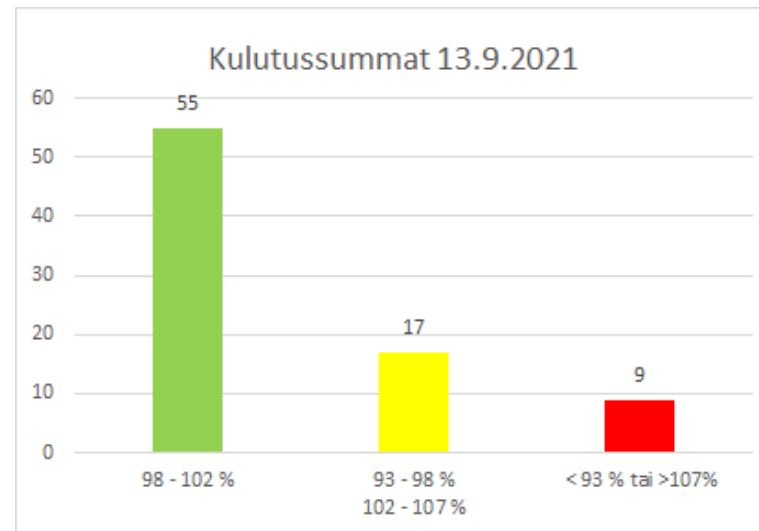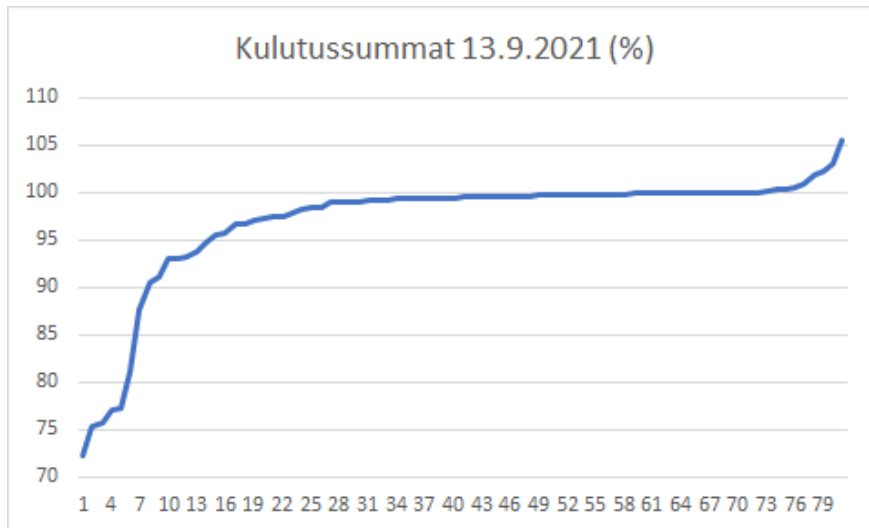

- Rajapistesummien ja verkon häviöiden laskennan kanssa haasteita johtuen merkittävistä puutteista rajapistemittausten osalta.

Tuloksista

1. Osapuoli on kuitanut tehdyiksi ProjectTopissa olevat validointitehtävät

- Varmistettu
- Ei tapahtumia
- Ongelma/Myöhässä - Viestikenttään kuvaus ongelmasta ja ratkaisusta

2. Fingrid Datahub tarkistaa hyväksyntäkriteereihin liittyvät tapahtumat datahubista

- Vaadittuihin validointeihin liittyviä tapahtumia löytyy
- Tapahtumien lukumäärä on suhteessa osapuolen kokoon
- Osapuoli ei ole merkittävää määrää virheellisiä tapahtumia

3. Fingrid Datahub tiedottaa tuloksesta


Tiedotus odottamattomista häiriöistä datahubin käyttöliittymässä/sanomarajapinnassa

- Tiedotamme jatkossa yllättävistä ongelmatilanteista ensimmäisenä Tukipalvelumme etusivulla sekä Datahub Palvelut -portaalin uutisvirrassa. Otathan tiedotuskanavamme aktiiviseen seurantaan. Uutisvirrassa käytämme datahubiin liittyvässä tiedotuksessa aina Datahub-tagia, jolloin datahubiin liittyviä uutisia on mahdollisuus suodattaa helpommin näkyviin.
- Mikäli ongelmatilanne pitkittyy hyödynnämme toki myös muita viestintäkanaviamme edellämainittujen lisäksi esim. datahub-uutiskirjettä ja TUKO-tiedotteita (Valmistautuminen Käyttöönottoon -sivulla).



Kenraaliharjoitus

Kenraalin aikataulu

Datahubin teknisen käyttöönottosuunnitelman kuvaus 1.3, luvun 18 mukaan

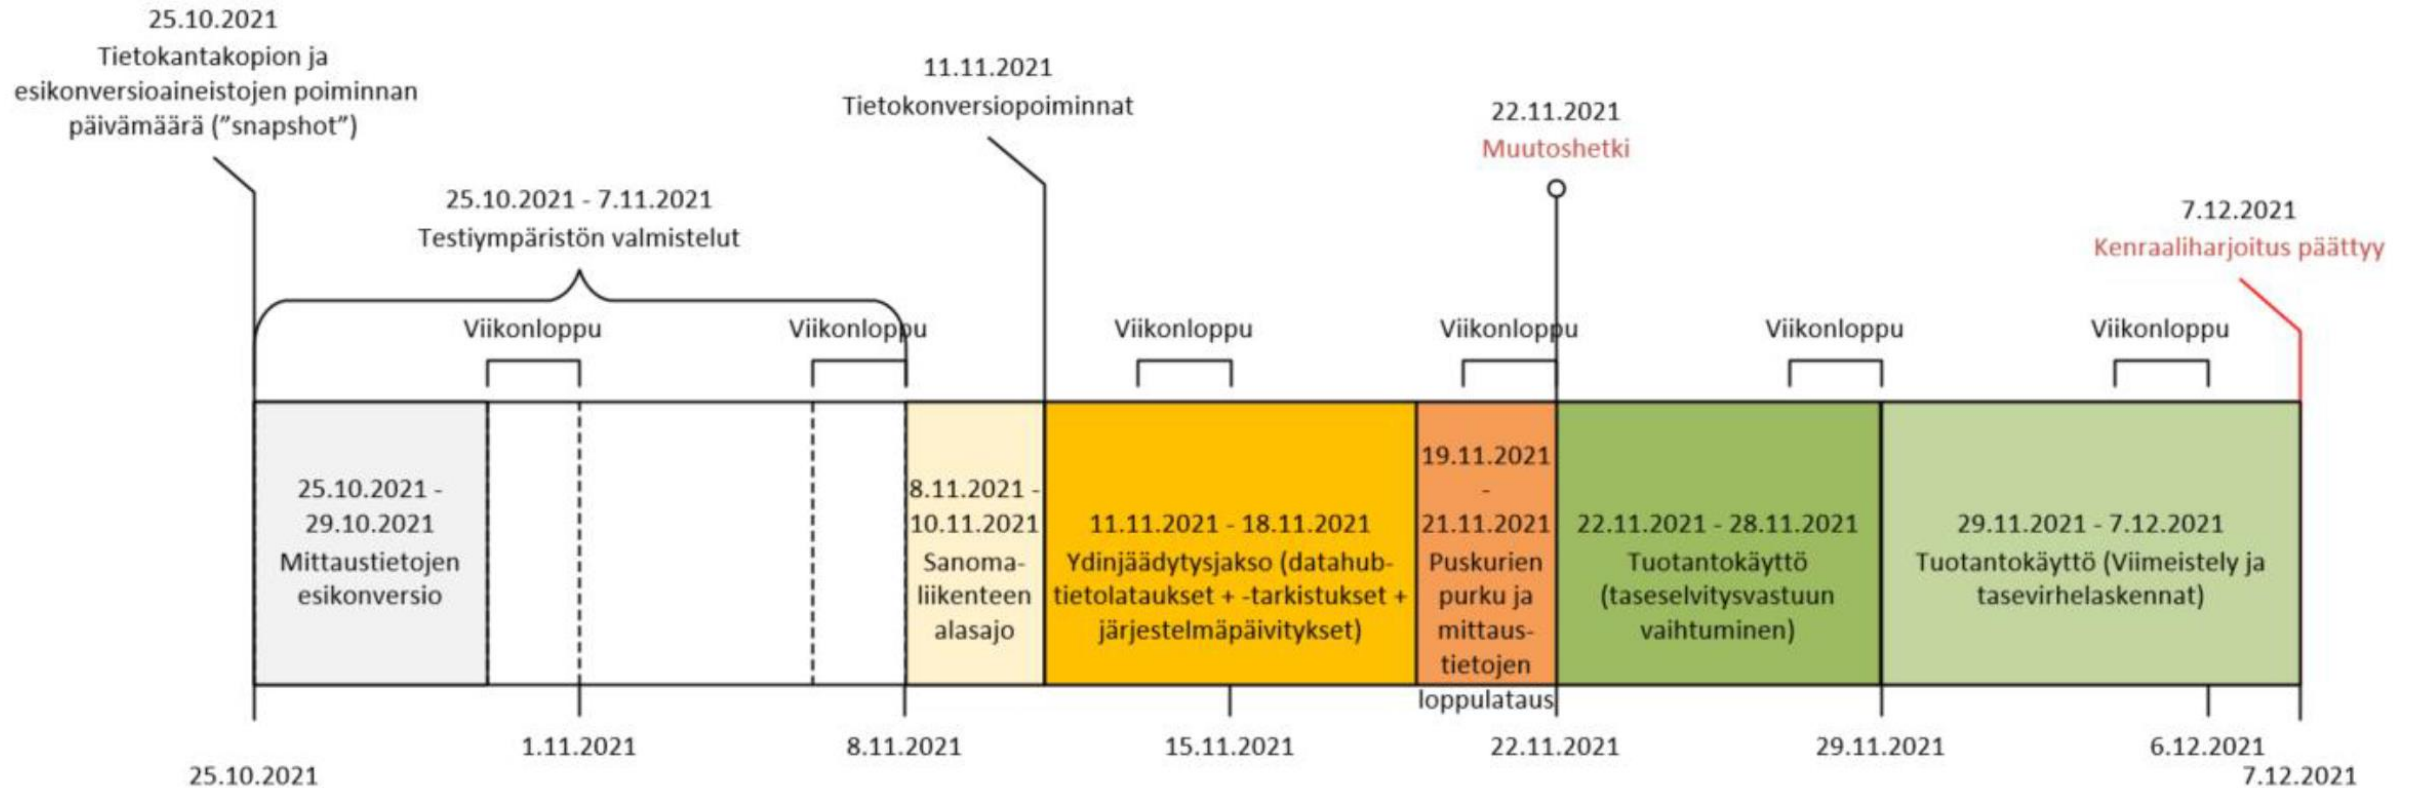

Pääsyoikeudet

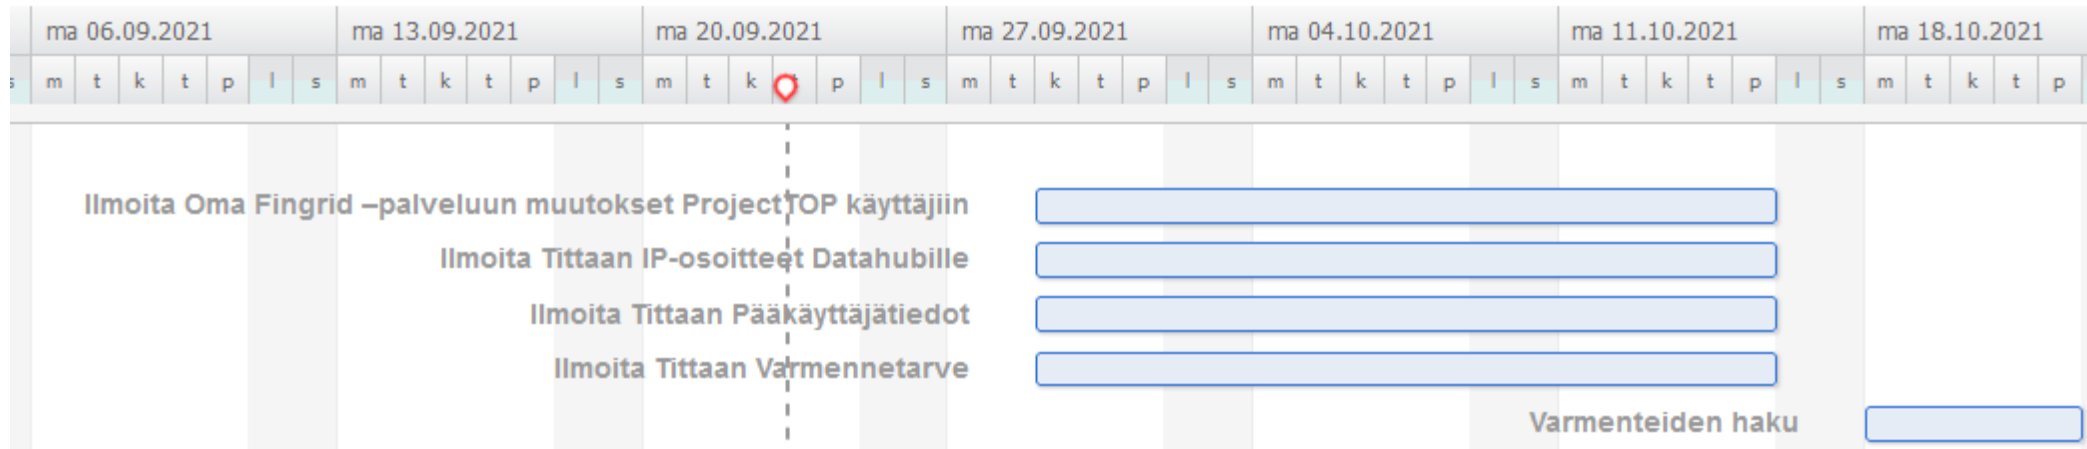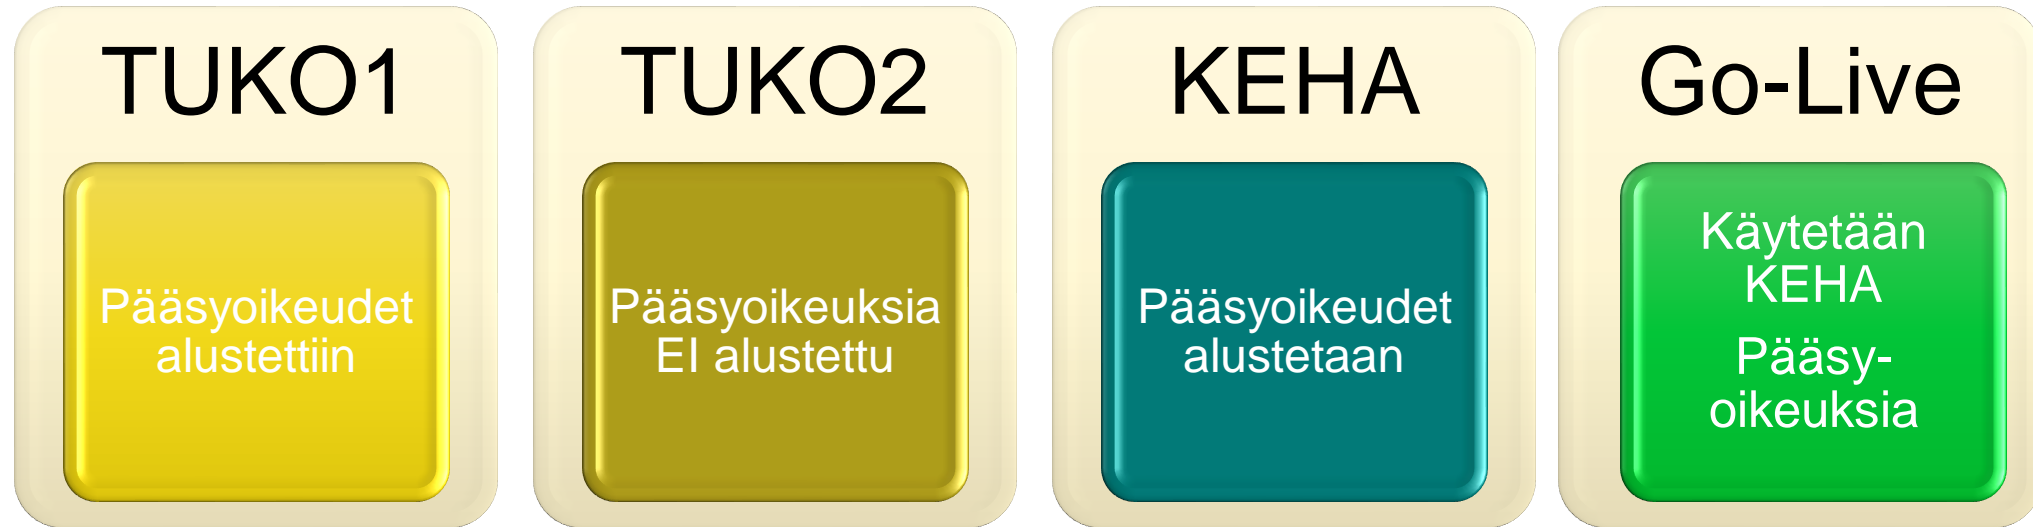

Seurantapalaverit

Seuranta / Info / Kysely –palaverit 11.10 – 10.12
Ma - Ke - Pe klo 10 – 10:30

→ 7.10 saakka TO seurantapalaverit 09 – 09:30

28.9 Puskuroinnin koulutus

30.9 Datamigraation läpikäynti

1.10 Ajankohtaisseminaari

22.9 Kolme varttia / Sopimusten peruutus

6.10 Kolme varttia / Loppuasiakasportaali

Puskuroinnin koulutus 28.9

Heidi käy käytännön esimerkein läpi
Puskuroinnin käyttöönotossa



→ 7.10 saakka TO seurantalaverit 09 – 09:30

28.9

Puskuroinnin koulutus

30.9

Datamigraation läpikäynti

1.10 Ajankohtaisseminaari

22.9 Kolme varttia / Sopimusten peruutus

6.10 Kolme varttia / Loppuasiakasportaali

Kuinka onnistut datamigraatiossa 30.9

HUOM!

Myös myyjät tekevät perustietojen esikonversion KEHAssa ja käyttöönotossa.



→ 7.10 saakka TO seurantalaverit 09 – 09:30

28.9 Puskuroinnin koulutus

30.9 Datamigraation läpikäynti

1.10 Ajankohtaisseminaari


22.9 Kolme varttia / Sopimusten peruutus

6.10 Kolme varttia / Loppuasiakasportaali

Ajankohtaisseminaari 1.10

Mielenkiintoisessa seminaarissa on varattu aikaa KEHAn suunnitelman läpikäyntiin

Jos et ole ilmoittautunut, niin voit hypätä mukaan seminaariin osoitteessa
<https://palvelut.datahub.fi/fi/datahub/tilaisuudet-ja-webinaarit>

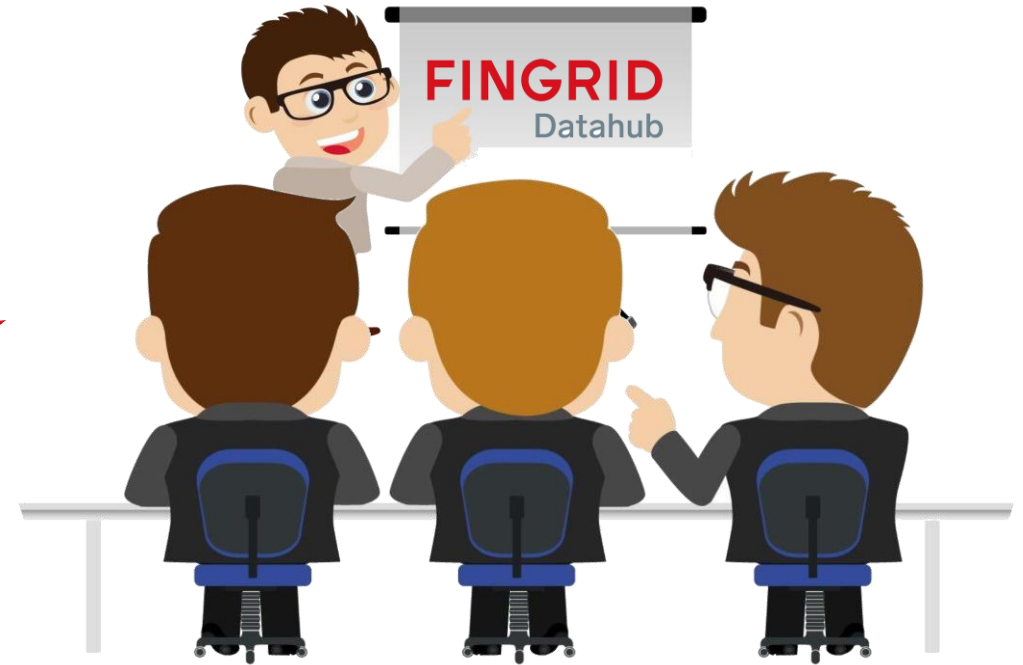

→ 7.10 saakka TO seurantalaverit 09 – 09:30
28.9 Puskuroinnin koulutus
30.9 Datamigraation läpikäynti

1.10 Ajankohtaisseminaari

22.9 Kolme varttia / Sopimusten peruutus
6.10 Kolme varttia / Loppuasiakasportaali

Kysymykset

?

Ensi viikolla

- Tuotannollinen koekäyttö päättyy
- Hyväksyntäkriteerit saavuttaneet julkaistaan

Kiitos!

Päiväinfot 14.9 - 29.9 kello 13.30

**22.9.2021 klo 10: Koulutuksen kolme varttia:
Sopimusten peruutus**

28.9.2021 klo 15: Datahub webinaari: Puskurointi

**Seuraava seurantapalaveri
30.9.2021 klo 9: Teams Live Event**

**30.9.2021 klo 10: Datahub webinaari:
Onnistu Datahub tietokonversiossa**

**01.10.2021 klo 9-14 Datahub-
ajankohtaisseminääri**

Muista linkin päivittyminen!

<https://palvelut.datahub.fi/fi/datahub/tilaisuuudet-ja-webinaarit>





Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oy Lökkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Y-tunnus: 2745543-5

www.fingrid.fi

FINGRID
Datahub
